ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	**REVISIONE 7 DEL**	**1 giorno?**	**mer 26/10/22**	**mer 26/10/22**	
2	Getto marciapiedi	2 giorni	mar 25/10/22	mer 26/10/22	
3	Disarmo marciapiedi	2 giorni	gio 27/10/22	ven 28/10/22	2
4	**LATO GRATTACOPPA**	**67 giorni**	**lun 24/10/22**	**mar 24/01/23**	
5	Approvvigionamento materiale per terre armate	1 giorno	gio 03/11/22	gio 03/11/22	
6	Tombamento canale consorzio	3 giorni	lun 24/10/22	mer 26/10/22	
7	Esecuzione scavo per terre rinverdite	8 giorni	mar 25/10/22	gio 03/11/22	
8	Esecuzione di terre armate rinverdite sponda sinistra	17 giorni	lun 07/11/22	mar 29/11/22	
9	Nuovi rilevati stradali (prima fase)	20 giorni	mer 09/11/22	mar 06/12/22	8II+2 giorni
10	Realizzazione nuova infrastruttura I.P.	5 giorni	mer 07/12/22	mar 13/12/22	9
11	Realizzazione nuova infrastruttura Telecom	3 giorni	mer 14/12/22	ven 16/12/22	10
12	Rilevati stradali (seconda fase)	10 giorni	lun 19/12/22	ven 30/12/22	11
13	Posa in opera di embrici	5 giorni	lun 02/01/23	ven 06/01/23	12
14	Conglomerati bituminosi	5 giorni	lun 09/01/23	ven 13/01/23	13
15	Posa in opera guard-rail	7 giorni	lun 16/01/23	mar 24/01/23	14
16	**LATO TORRI**	**90 giorni**	**mer 26/10/22**	**mar 28/02/23**	
17	Esecuzione scavo per terre rinforzate con gabbioni	7 giorni	mer 26/10/22	gio 03/11/22	
18	Sottofondazione terre rinforzate	6 giorni	ven 04/11/22	ven 11/11/22	17
19	Esecuzione di terre armate con gabbioni rampa Torri	30 giorni	lun 14/11/22	ven 23/12/22	18
20	Nuovi rilevati stradali (prima fase)	40 giorni	gio 10/11/22	mer 04/01/23	8II+3 giorni
21	Cordolo in C.A. per posa guard rail lato torri	10 giorni	gio 05/01/23	mer 18/01/23	20
22	Maturazione getto	20 giorni	gio 19/01/23	mer 15/02/23	21
23	Rilevati stradali (seconda fase)	10 giorni	gio 19/01/23	mer 01/02/23	21
24	Posa in opera di embrici	5 giorni	gio 02/02/23	mer 08/02/23	23
25	Nuona infrastruttura per I.P.	7 giorni	gio 02/02/23	ven 10/02/23	23
26	Conglomerati bituminosi	5 giorni	lun 13/02/23	ven 17/02/23	25
27	Posa guard rail	7 giorni	lun 20/02/23	mar 28/02/23	26
28	Impermeabilizzazione soletta	10 giorni	mar 10/01/23	lun 23/01/23	20FI+3 giorni
29	Smaltimento idraulica di piattaforma	10 giorni	mar 24/01/23	lun 06/02/23	28
30	Conglomerati bituminosi	10 giorni	mar 07/02/23	lun 20/02/23	29
31	Posa giunti di dilatazione	5 giorni	mar 21/02/23	lun 27/02/23	30
32	Montaggio barriere pedonali e guard rail	15 giorni	mar 21/02/23	lun 13/03/23	30
33	Collaudo impalcato	1 giorno?	mar 14/03/23	mar 14/03/23	32
34	Realizzazione impiato di illuminazione	15 giorni	mar 21/02/23	lun 13/03/23	30
35	Segnaletica orizzontale e verticale	10 giorni	mar 28/02/23	lun 13/03/23	30FI+5 giorni
36	Smobilizzo cantiere	5 giorni	mar 14/03/23	lun 20/03/23	35
37	Rimozione segnali di deviazione	2 giorni	mar 21/03/23	mer 22/03/23	36
38	**FINE LAVORI**	**1 giorno**	**gio 23/03/23**	**gio 23/03/23**	**37**
39					
40					
41	EMISSIONE del	1 giorno?	mer 10/06/20	mer 10/06/20	
42	Revisione 1 del	1 giorno?	mar 16/02/21	mar 16/02/21	
43	Revisione 2 del	1 giorno?	ven 07/05/21	ven 07/05/21	
44	Revisione 3 del	1 giorno?	lun 24/05/21	lun 24/05/21	
45	Revisione 4 del	1 giorno?	mar 15/06/21	mar 15/06/21	
46	Revisione 5 del	1 giorno?	lun 13/09/21	lun 13/09/21	
47	Revisione 6 del	1 giorno?	mer 29/12/21	mer 29/12/21	
48	Revisione 7 del	1 giorno?	gio 28/07/22	gio 28/07/22	

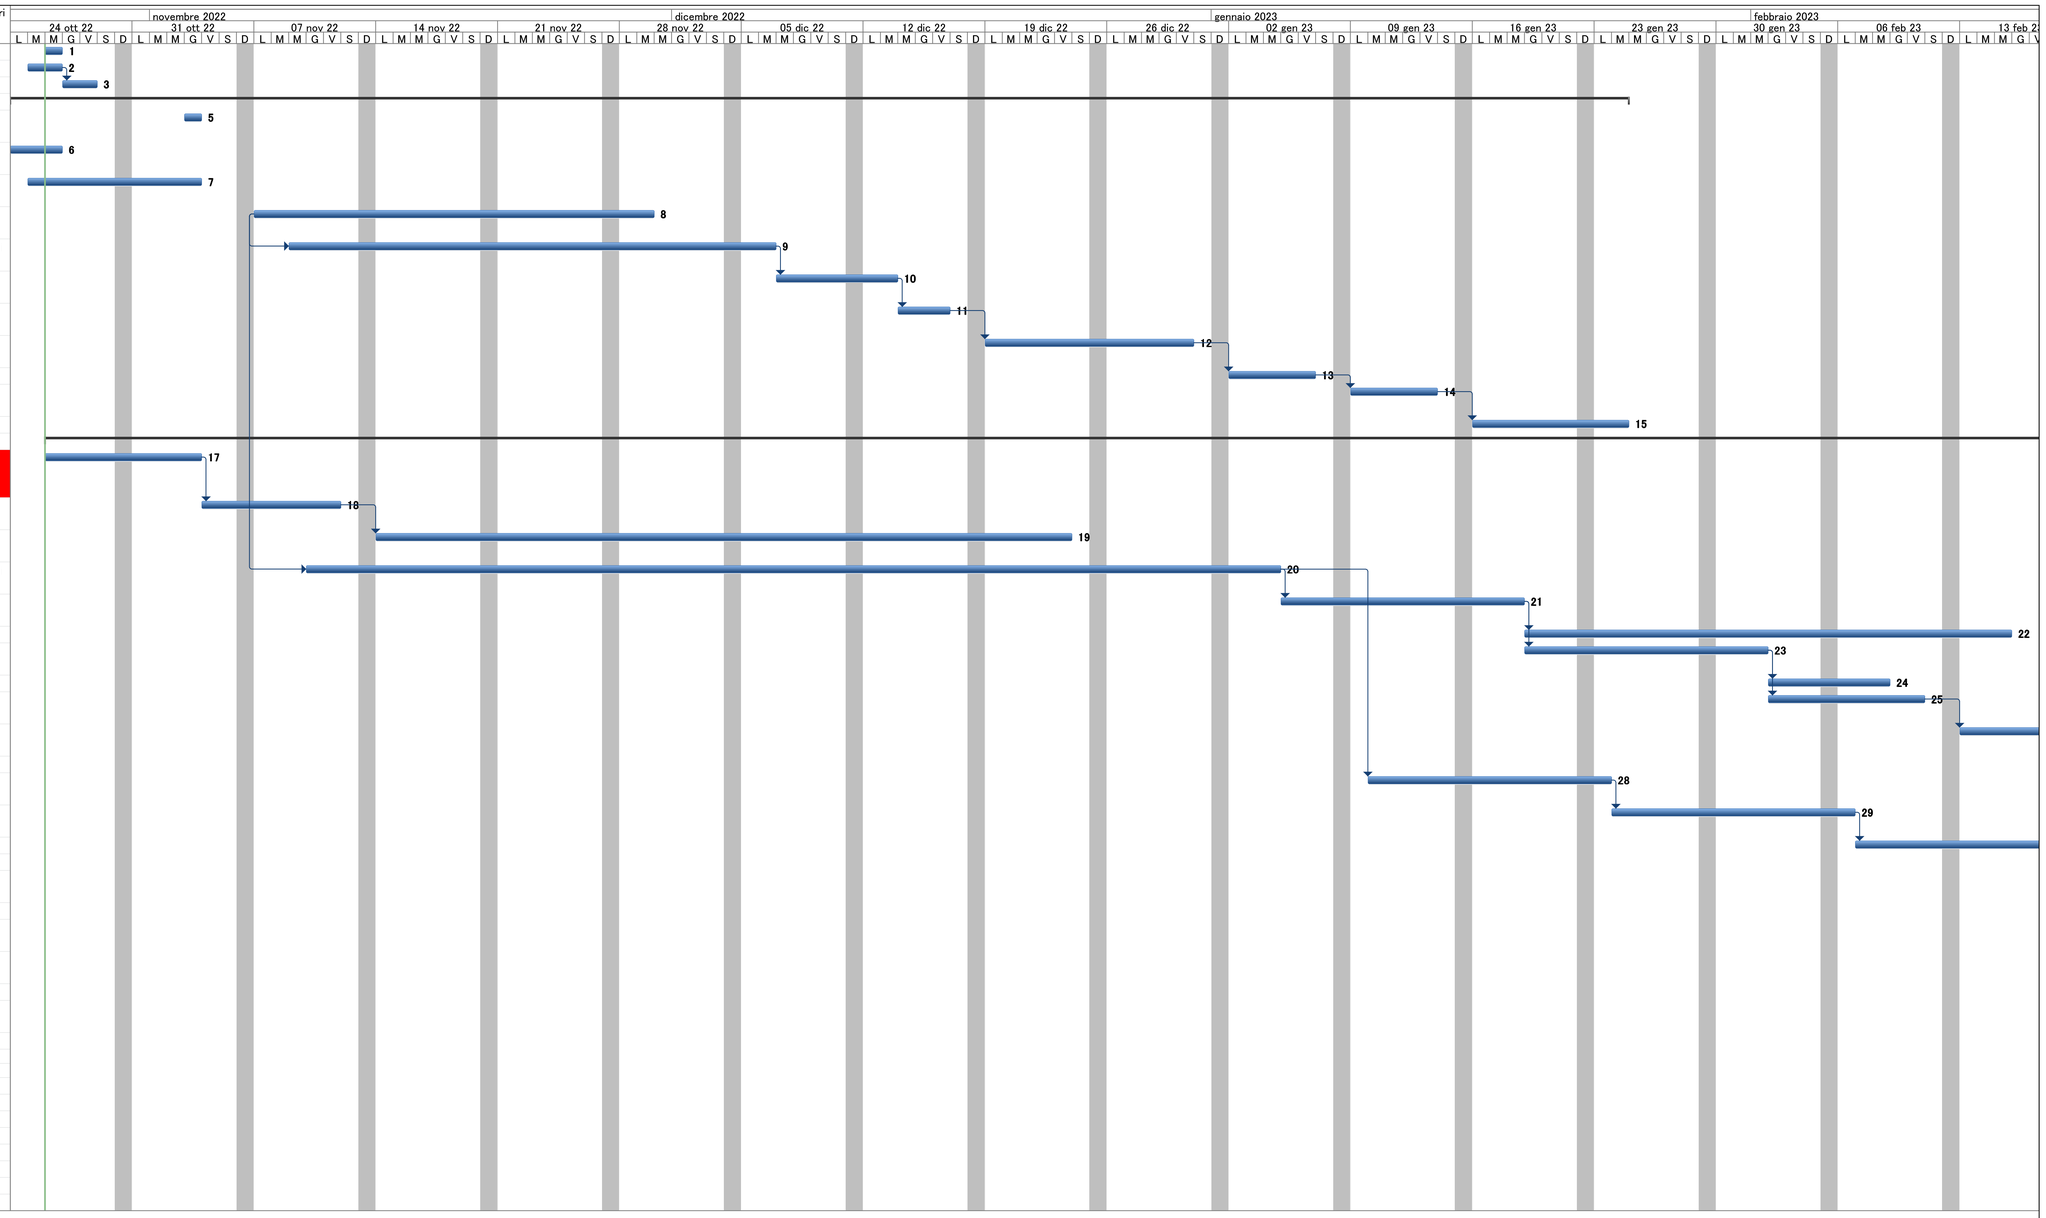

COMUNE DI RAVENNA
Comune di Ravenna - Protocollo Generale
A
"Copia analogica del documento informatico"
Protocollo N.0224104/2022 del 27/10/2022
'Class.' 6.5
Allegato N.1: CRONO PROGRAMMA REV8

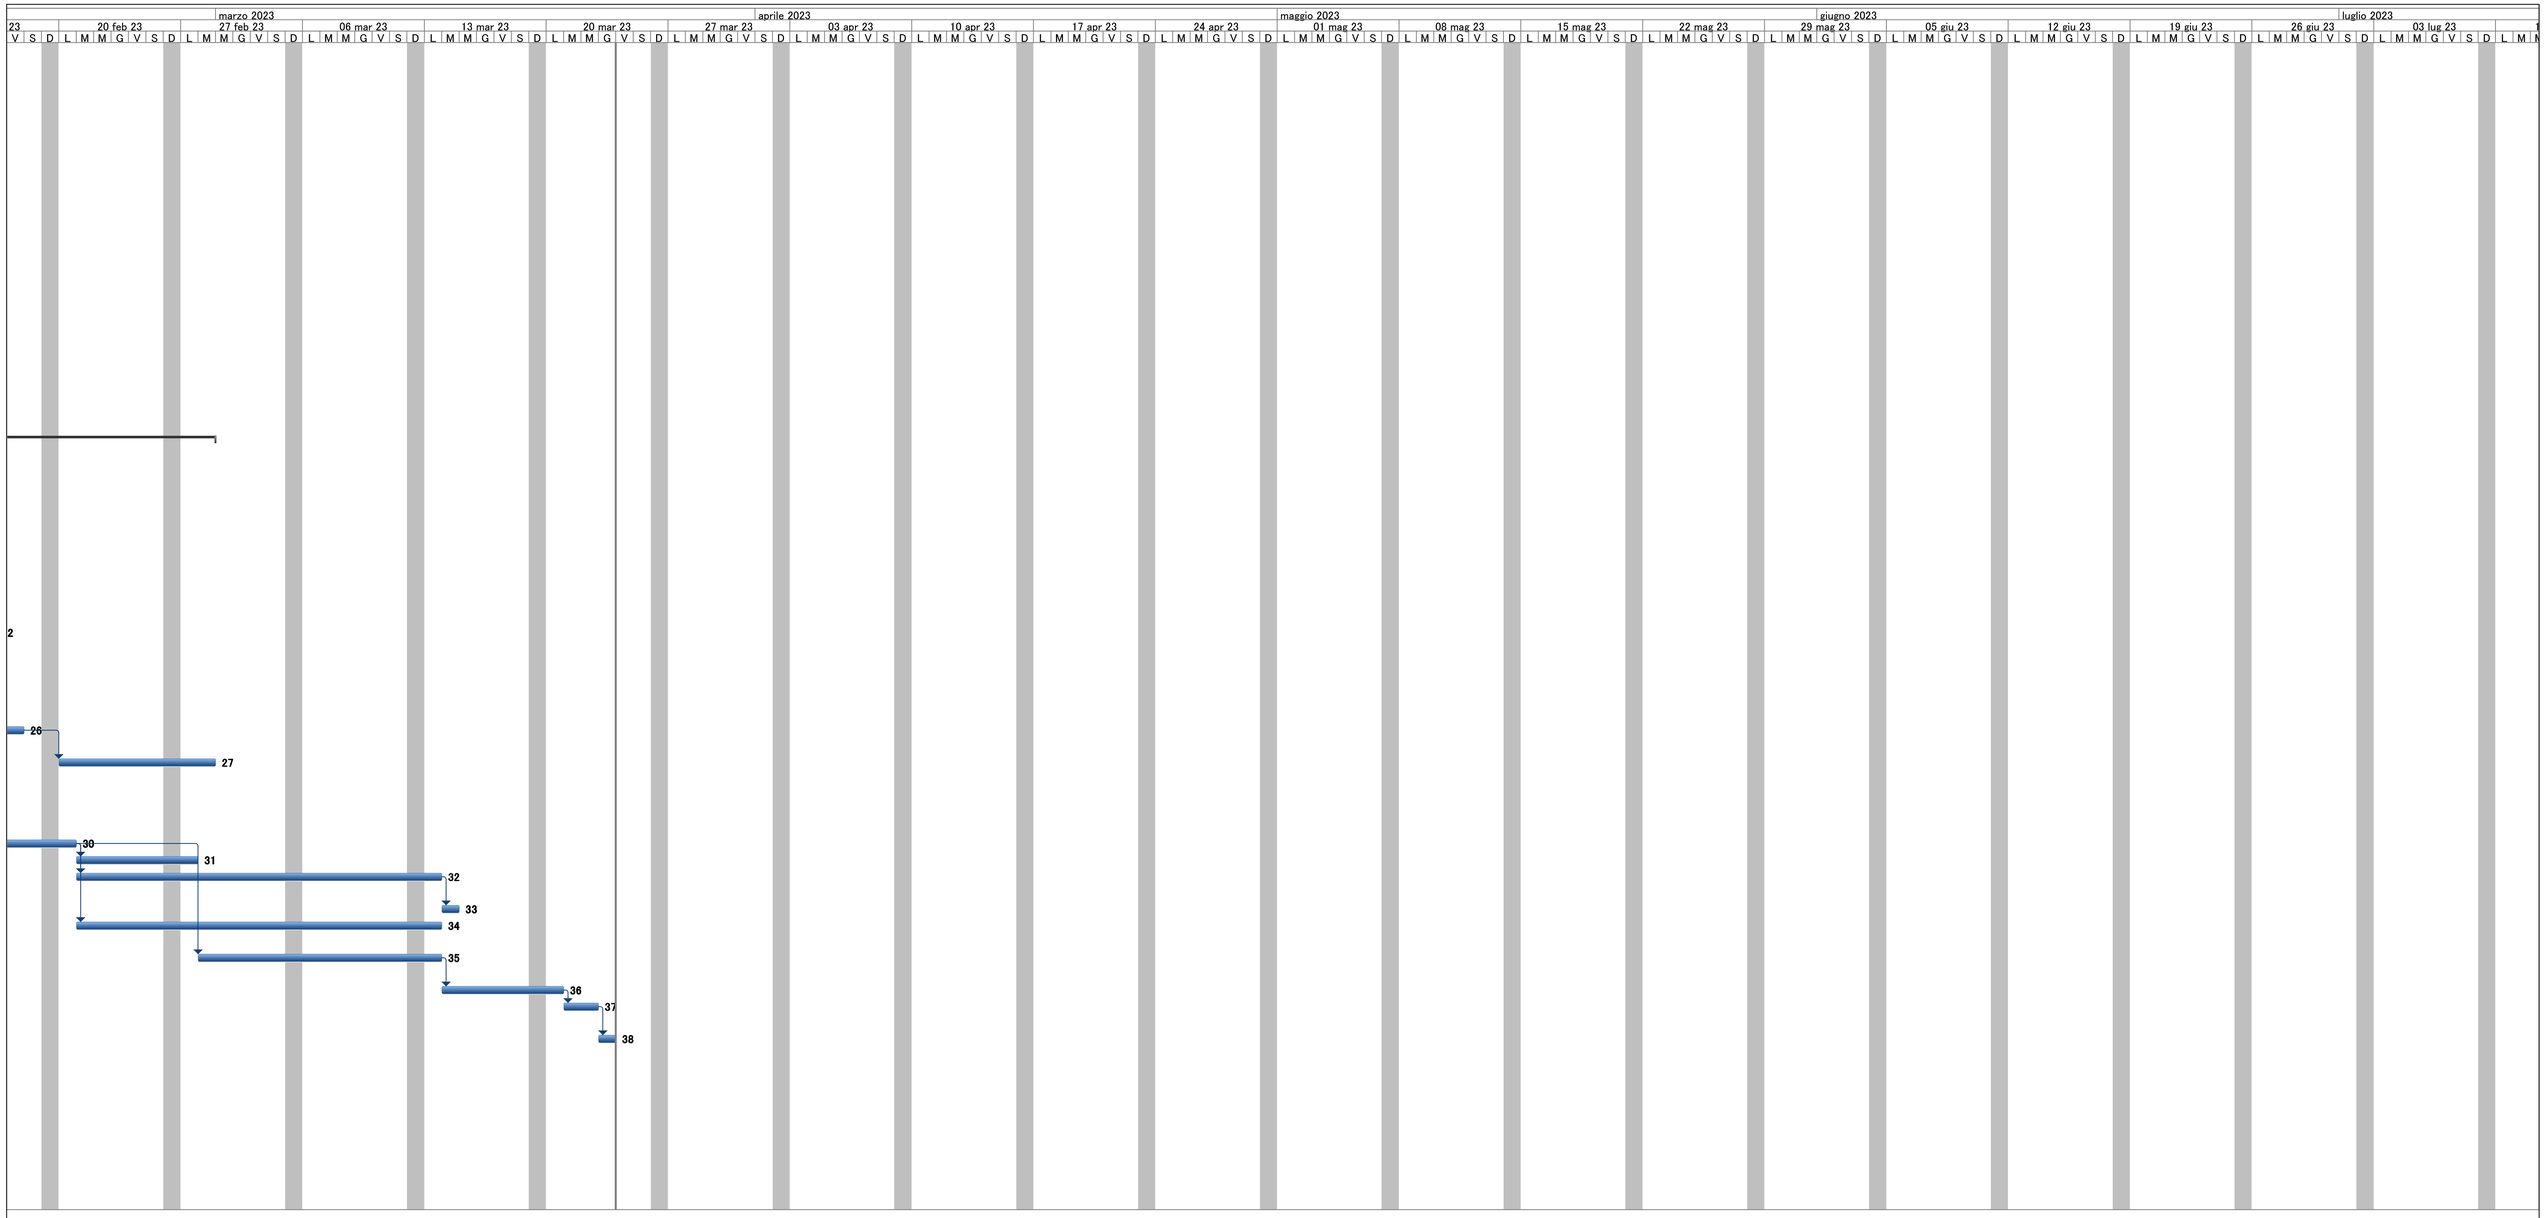

COMUNE DI RAVENNA
Comune di Ravenna - Protocollo Generale

A

"Copia analogica del documento informatico"

Protocollo N.0224104/2022 del 27/10/2022
'Class.' 6.5
Allegato N.1: CRONO PROGRAMMA REV8
